Bilan de suivi

Maestro

Rappel du projet
Streaming de musique

01

Écoute de musique

L'application doit proposer un service d'écoute de musique viable et simple d'utilisation.

02

Mise en ligne de musique

L'un des principes de base est de permettre à tout le monde de publier des morceaux de musiques.

03

Mini-jeux

Le plus de notre application par rapport à ce qui est déjà proposé sur le marché, c'est la mise en place de mini-jeux musicaux.

Tâches réalisées :
Par l'équipe
du 13 janv. au 13 fév.

Durant ce sprint, l'équipe au global, a travaillé sur différentes grandes tâches. Elles ne sont pas toutes terminés mais l'objectif est qu'elles le soient avant vendredi 13 février.

Écoute de musique

L'écoute de musique est fonctionnelle, il va falloir maintenant travailler la liste de lecture.

Déploiement de la base de données

La base de données est déployée sur CodeFirst.
Le soucis c'est qu'on ne peut pas y accéder tant que notre application n'est pas elle non plus déployée sur CodeFirst.

Connexion/Inscription

On peut se connecter et créer un compte. Nous n'avons pas encore pu tester avec la base de données à cause du problème avec CodeFirst.

Gestion des playlists

On peut créer, modifier et supprimer une playlist. On ne peut pas encore écouter une playlist.

Prévisions et réalité

Prévision du sprint

Logique métier (backend)

13/01

- Connexion/ inscription
- Écoute de musique
- Gestion des playlists

27/01

10/02

Interface visuelle (frontend)

13/01

- Page d'acceuil
- Menu de navigation
- Lecteur
- Page des playlists

27/01

06/02

10/02

Base De Données

13/01

- Reprise des MCD/MLD

22/01

- Déploiement

27/01

Prévision Chahid

Base De Données (6h)

13/01 → **Restructuration de l'architecture** (30min) → **Refonte du MCD** (1h) → **Refonte du MLD** (30min) → 22/01 → **Écriture du script d'initialisation de la base** (30min) → **Déploiement** (3h30) → 27/01

Page des playlists (4h)

27/01 → **Stylisme de la page** (4h) → 11/02

Gestion des playlists (6h)

27/01 → **Création d'une playlist** (3h) → **Modification d'une playlist** (2h) → **Suppression d'une playlist** (1h) → 11/02

Réel Chahid

Base De Données (10h30)

13/01 → **Restructuration de l'architecture** (2h) → **Refonte du MCD** (3h) → **Refonte du MLD** (1h30) → 27/01 → **Écriture du script d'initialisation de la base** (1h) → **Déploiement** (3h) → 30/01

Page des playlists (1h)

30/01 → **Stylisme de la page** (1h) → 11/02

Gestion des playlists (4h30)

30/01 → **Création d'une playlist** (2h30) → **Modification d'une playlist** (1h) → **Suppression d'une playlist** (1h) → 06/02

Prévision Paul

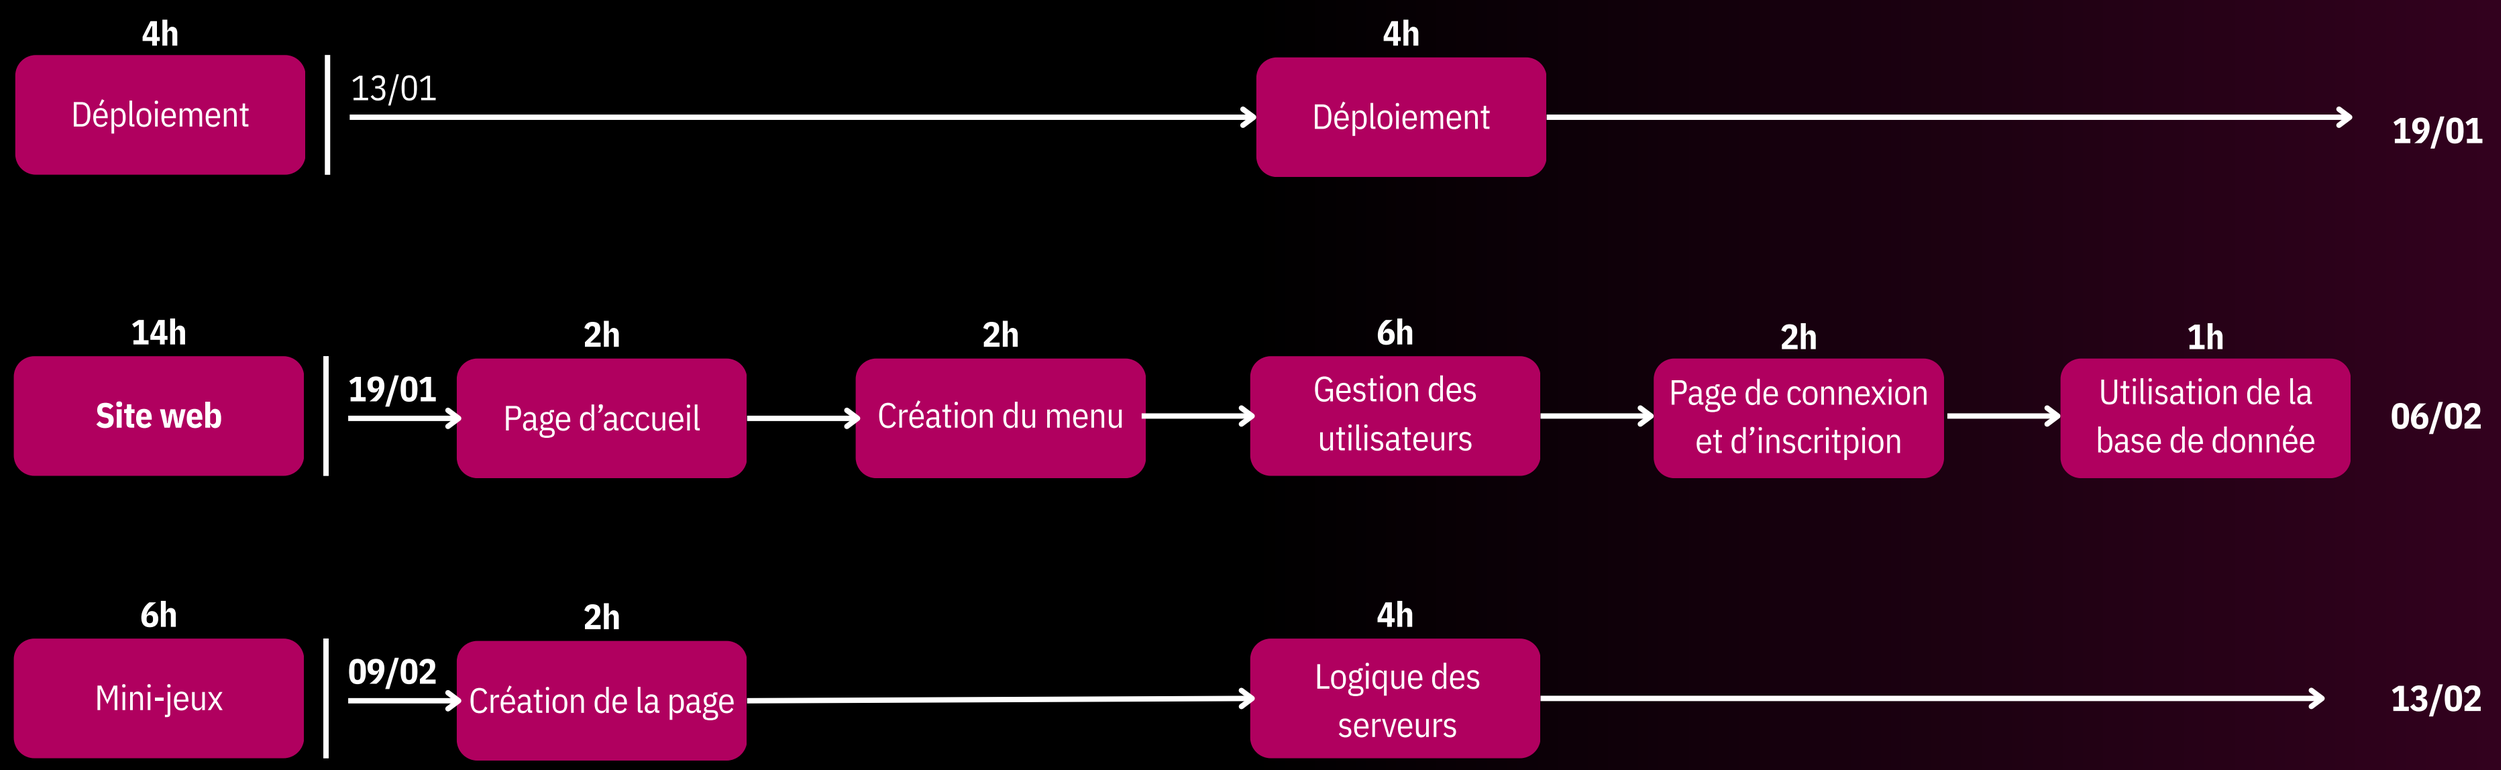

Réel Paul

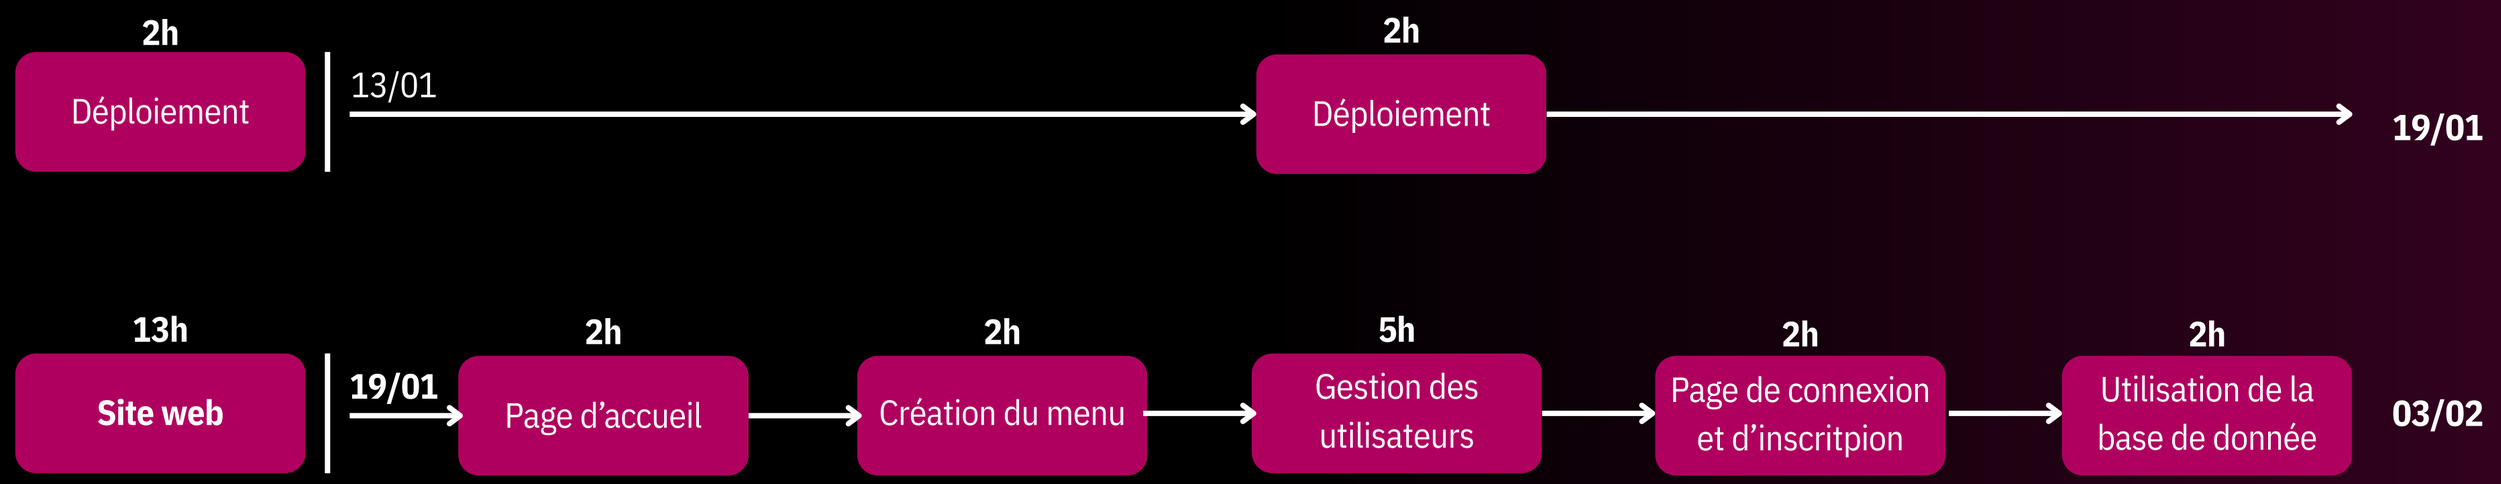
2h
Déploiement
13/01
2h
Déploiement
19/01
13h
Site web
19/01
2h
Page d'accueil
2h
Création du menu
5h
Gestion des utilisateurs
2h
Page de connexion et d'inscritpion
2h
Utilisation de la base de donnée
03/02

Prévision Louis

1h
Base de données

13/01 → 1h Préparation environnement → 27/01

3h
Structure de l'application

27/01 → 2h Conception → 1h Mise en place → 06/02

10h
Lecture d'une musique

27/01 → 4h Conception → 4h Fonctionnalité → 2h Respect de la pagination → 06/02

6h
Publication de musique

06/02 → 2h Implémenter la structure de la page → 2h Fonctionnement du glisser déposé → 2h Enregistrement du morceau → 11/02

Réel Louis

1h30
Base de données

13/01 →

30min
Conception

22/01 →

1h
Préparation environnement

→ 27/01

4h
Structure de l'application

27/01 →

2h
Conception

→

2h
Mise en place

→ 06/02

10h30
Lecture d'une musique

27/01 →

3h
Conception

→

3h30
Lien bouton -> lecture

→

2h
Sur-lecture

→

2h
Respect de la pagination

→ 06/02

Continuité des sprints

		1er sprint de dev			16h de sprint (12 janv. exclu)	22h	
	lundi 5 janv.	mardi 13, début bdd	jeudi 22 début du dev		rendez-vous gestion 06/02		
	2	3	4	5	6	7	
	6	4	4	4	6	6	
					64	70	

	2ème sprint			3ème sprint		4ème sprint		
	11/05			01/06		15/06		
	20	21	22	23	24	25	26	
	4	8	4	4	8	8	4	110
	74		86		98		110	

Suite du projet :
Prochain sprint du 11/05 au 29/05

Liste de lecture	11/05 →	Écouter une playlist	18/05 →	Écouter un album	→	26/05
Album	11/05 →	Création d'album	→	Modification d'un album	→	Suppression d'un album 18/05
Suggestion de musique	11/05 →	Suggestion Simple	26/05 →	Suggestion poussée	→	29/05
Profil utilisateur	11/05 →	Gestion des musiques publiées	26/05 →	Gestion de la bibliothèque	→	29/05

Retour sur les indicateurs

Dans notre premier de rendu, nous avions mis en place des indicateurs de suivi sur la qualité, le coût et le temps pour notre projet.

Temps

Coût

Qualité

Indicateurs de temps

NOMBRE HEURES PLANIFIÉES	426
COUT MAIN OEUVRE PLANIFIÉE	10224
TOTAL HEURES AVANCÉES	208
RAPPORT AVANCÉE/PLANIFIÉ	48,82629108
	Totales heures
Chahid	60
Hugo	31
Louis	63
Paul	54
	208

Indicateurs de coût

Main d'oeuvre

Augmentation de 12000 à 14000 en raison de la revue du coup de la main d'oeuvre

Coût coworking pour 4 pour 110h	1296
Coût main d'oeuvre planifiée	10224
Coût main d'oeuvre actuelle	4992
Amortissement ordinateurs + licences	166,6666667
Maintenance / hébergement	900
Facture exonérée	12586,66667
Prix à facturer au client	13845,33333

Indicateurs de qualité

Qualité du travail d'équipe

Questions sur le ressenti de l'équipe :

- Quelle est ton ressenti global sur l'ambiance de l'équipe ?
- Est-ce que tu trouves la répartitions des tâches inégale ?
- Êtes vous satisfait de l'avancement du projet ?

Pour garder une trace écrite de chaque réponse, un questionnaire sera rempli par chaque membre.

Qualité du code

Pour le moment, nous n'avons pas encore mis en place les outils de qualité présent sur CodeFirst. Nous préférons avancer plus sur le code avant de mettre en place ces outils.

Satisfaction de l'encadrant

Un questionnaire de satisfaction a été envoyé à notre enseignant encadrant, M.RESTITUITO. Ce questionnaire fait suite au rendez-vous que nous avons eu avec lui au début du sprint.

Résultats du questionnaire

Les points abordés étaient ils suffisamment informatifs ?

Une réponse



Prise de rendez-vous dans les temps ?

Une réponse



Comment estimer vous notre vue d'ensemble sur le projet ?

Une réponse

Suffisamment claire pour le moment

Comment estimez vous l'avancement du projet

Une réponse



Estimez vous que des points important n'ont pas étaient abordés durant ce rendez-vous ?

Une réponse

Non

Retour global :
L’équipe

Ressenti

Dans la globalité, nous sommes satisfait de l’ambiance au sein de l’équipe. Nous sommes fier de notre travail et de notre avancement.

Les écarts

Nous avons fait face à des écarts, comme avec la base de données. Pour rattraper ces derniers, nous avons été plus efficaces sur d’autres tâches.
